




Banebrydende projektporteføljestyling og gevinstrealisering i 2015




Projektplanlægning og eksekvering

Business Case

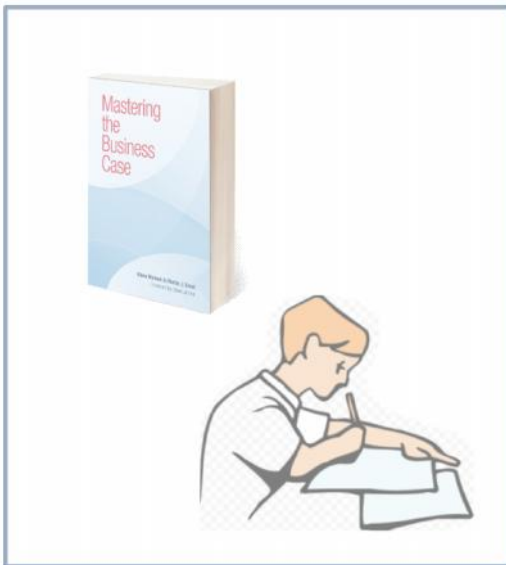

Projektplanlægning – og eksekvering

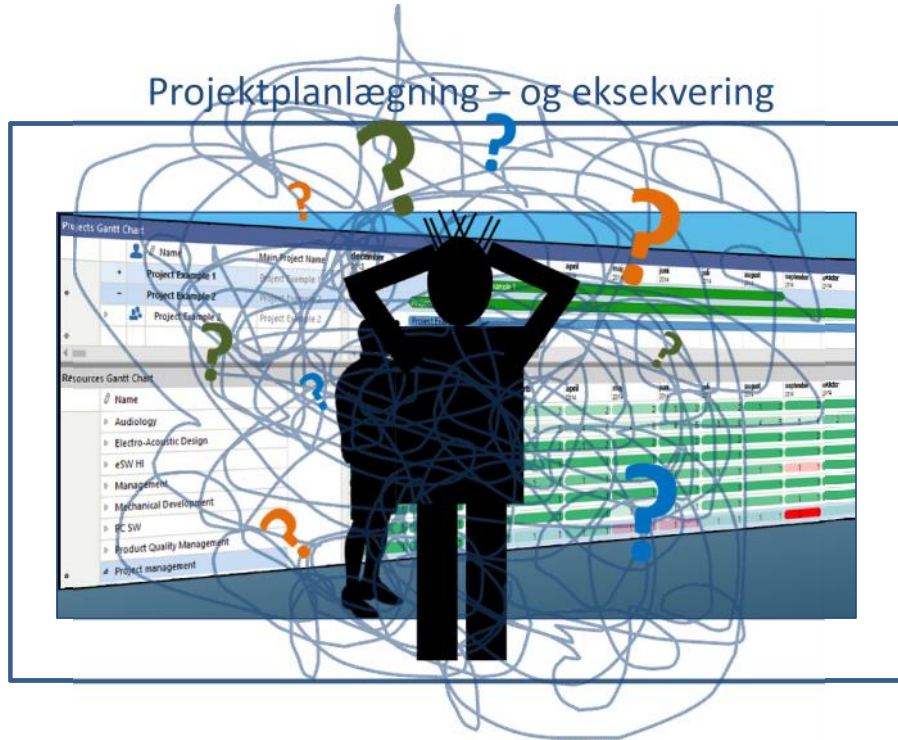

Gevinstrealisering




Drømmen om at realisere Business Casen



Men virkelighedens verden er ofte anderledes end drømmebilledet



Porteføljeplanlægning

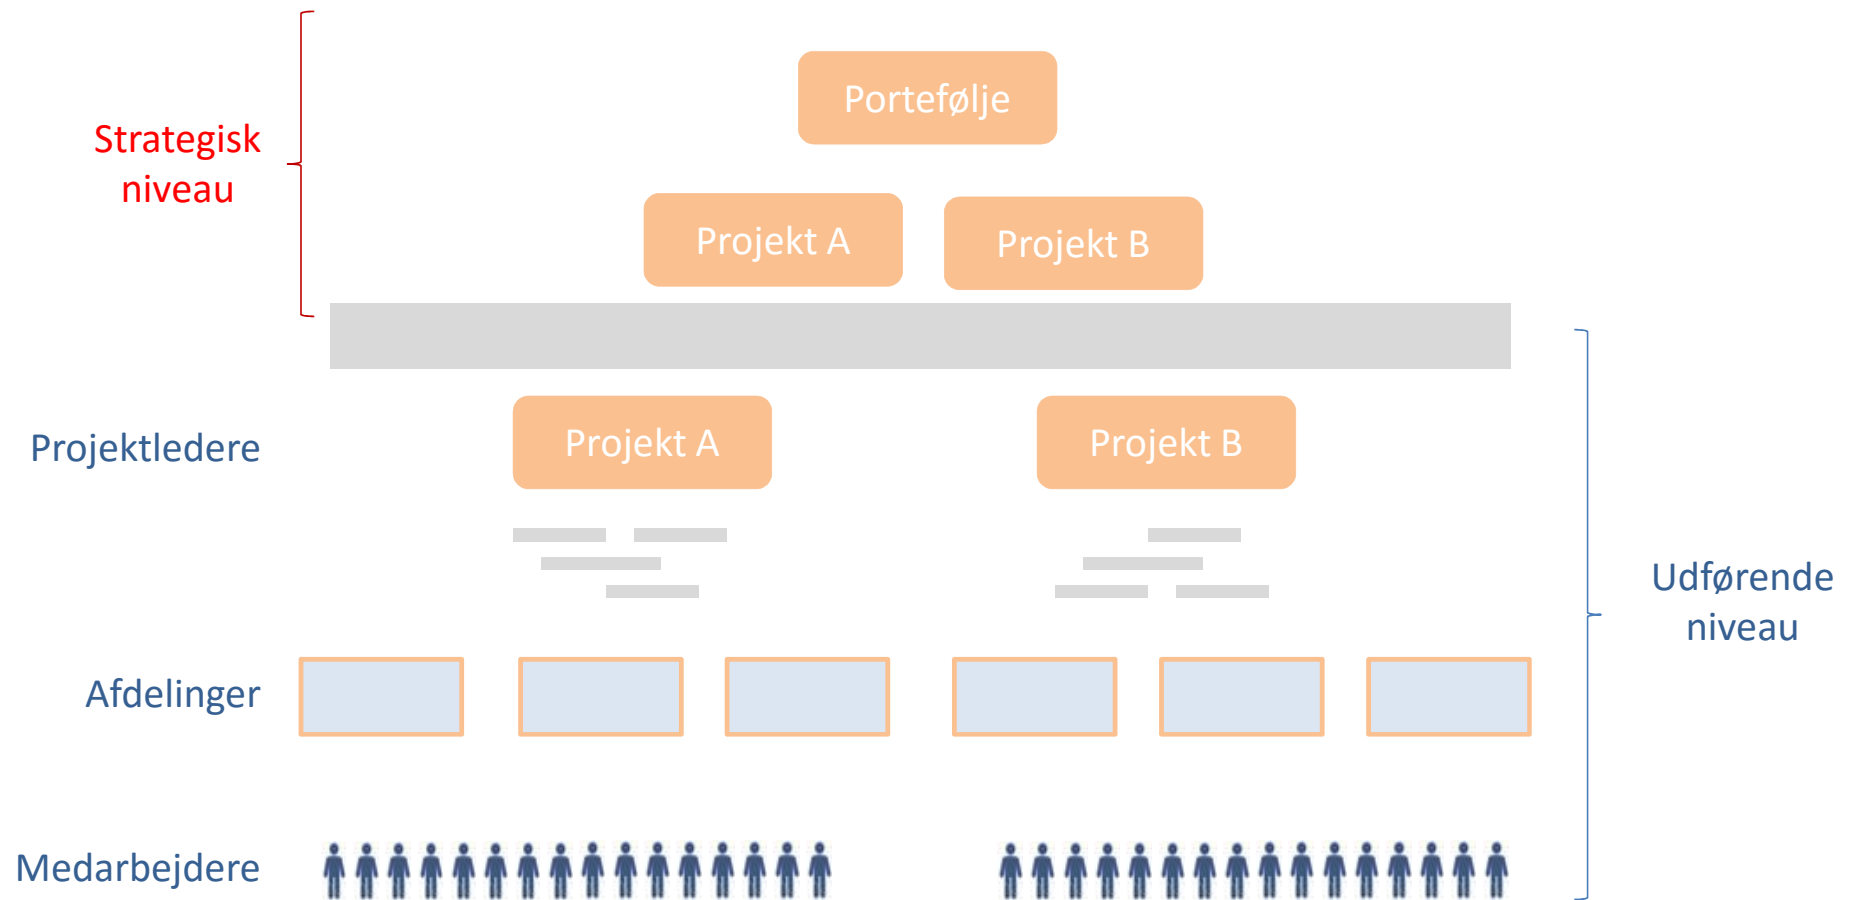

Porteføljeplanlægning



Strategisk
niveau




Strategisk
beslutning

Hvem bevarer overblikket?

Projektledere




Projekt A



Projekt B



Afdelinger

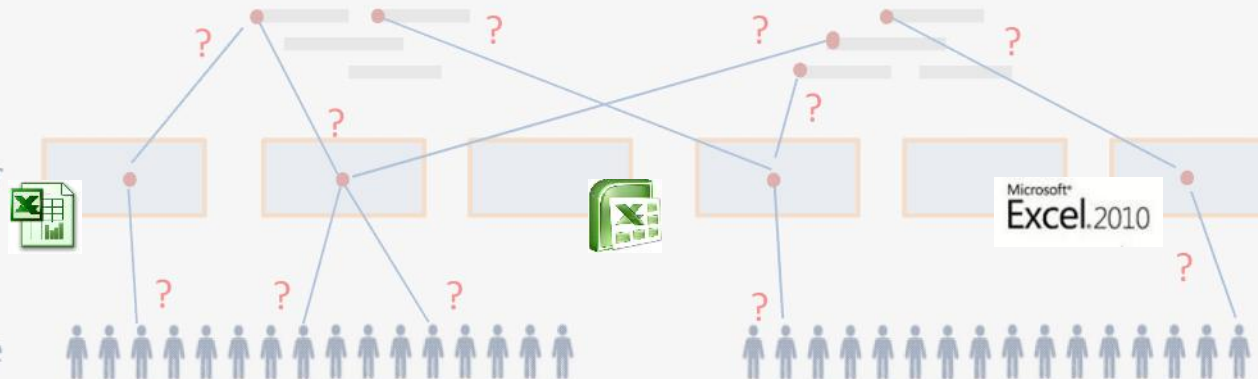


Udførende
niveau

Medarbejdere




Projekter kan i sig selv være komplekse, men der opstår en anden form for kompleksitet når projekterne deler ressourcer på tværs af projekterne. Flaskehalse opstår og sænker organisationens effektivitet med risiko for at hele projektet forsinkes


Alle projekter og ressourcer er samlet i et system

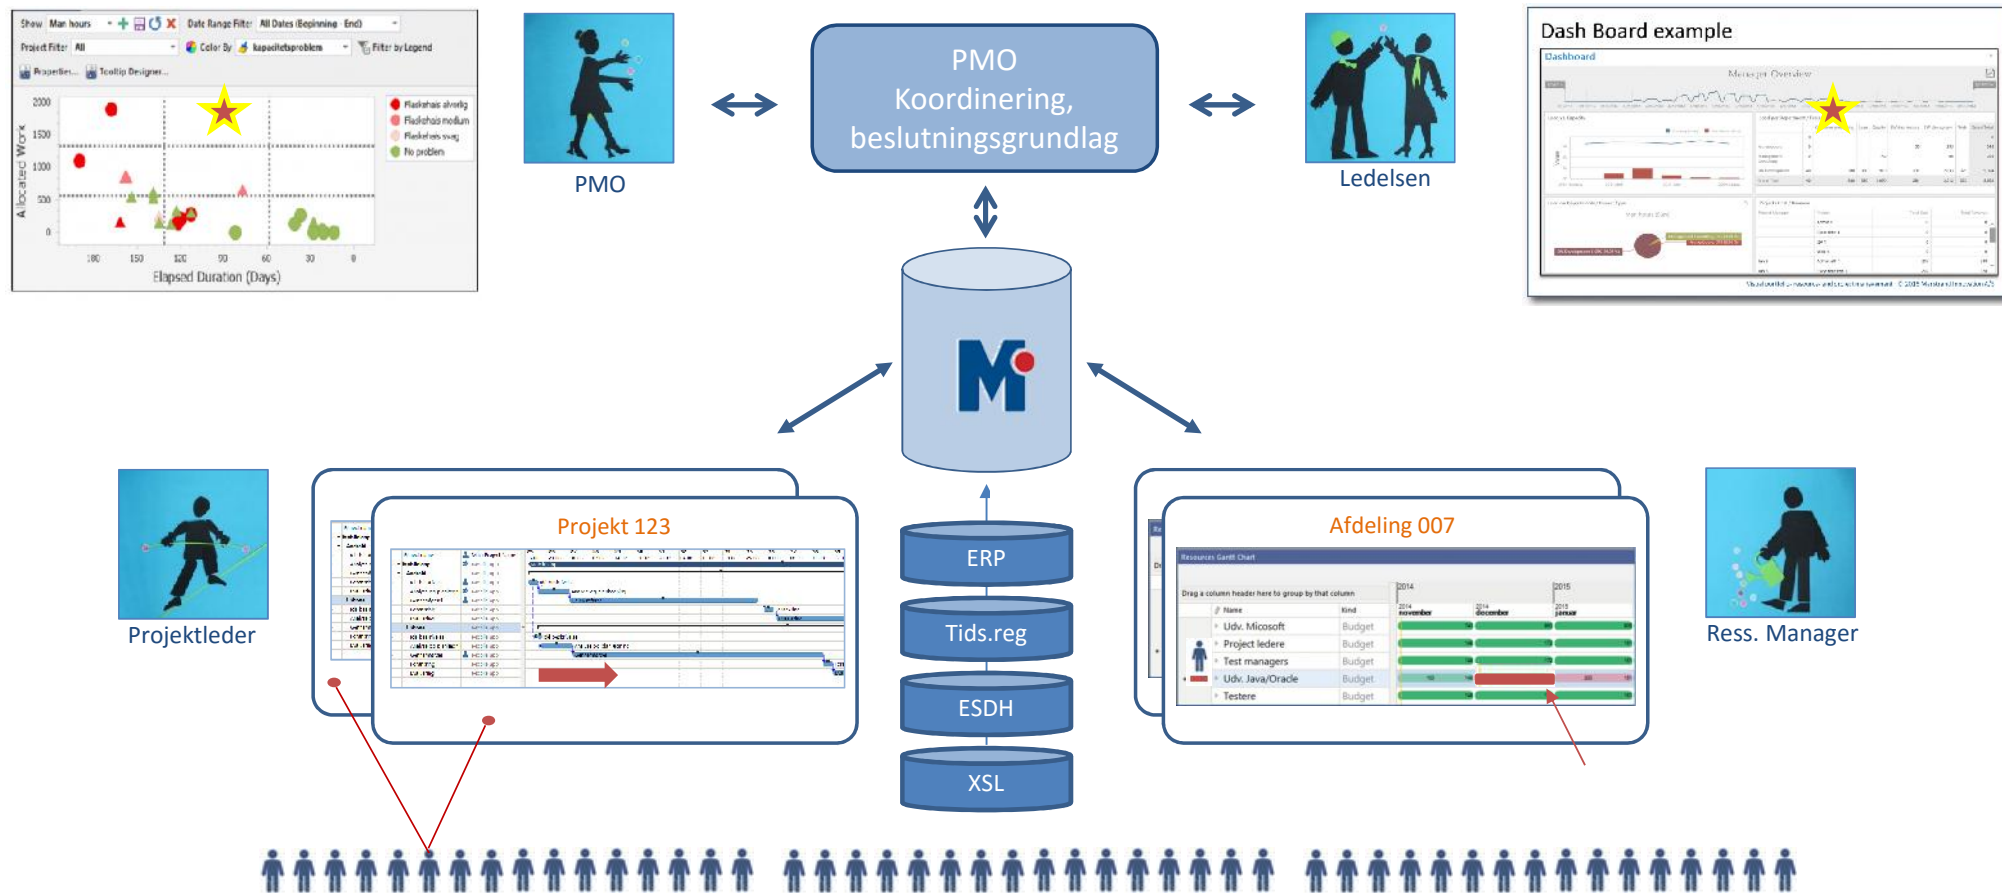

Alle tidshorisonter i samme system (MPI)

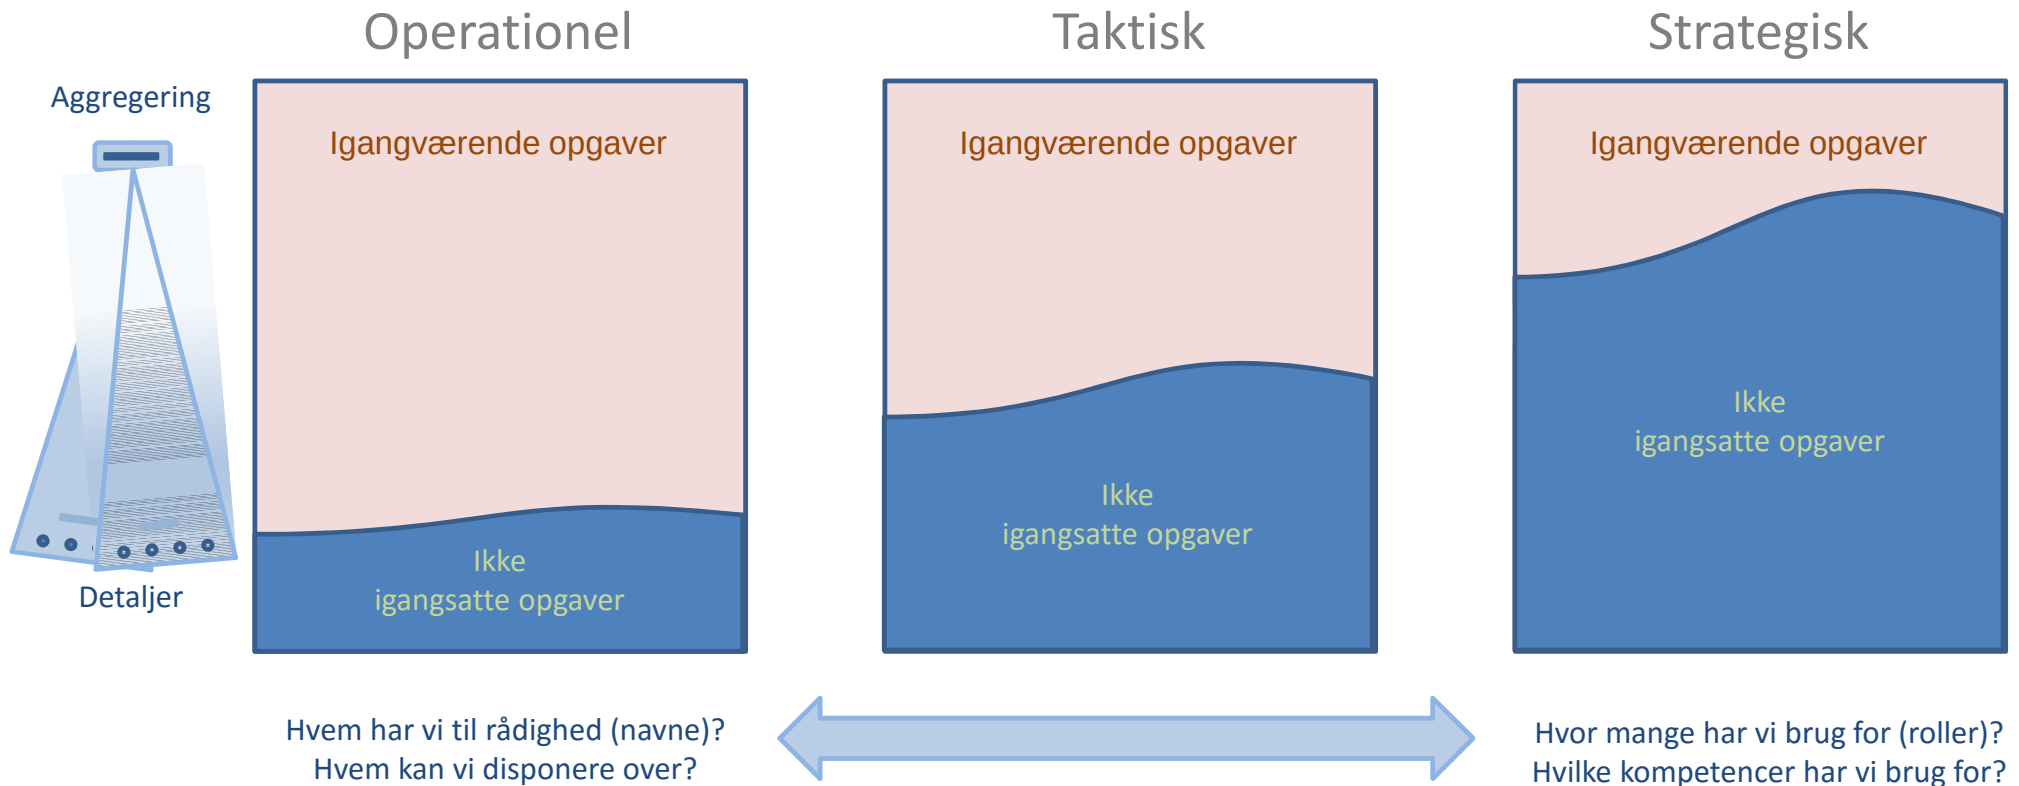


Eksempel analyse: Portefølje- og ressourcestyring

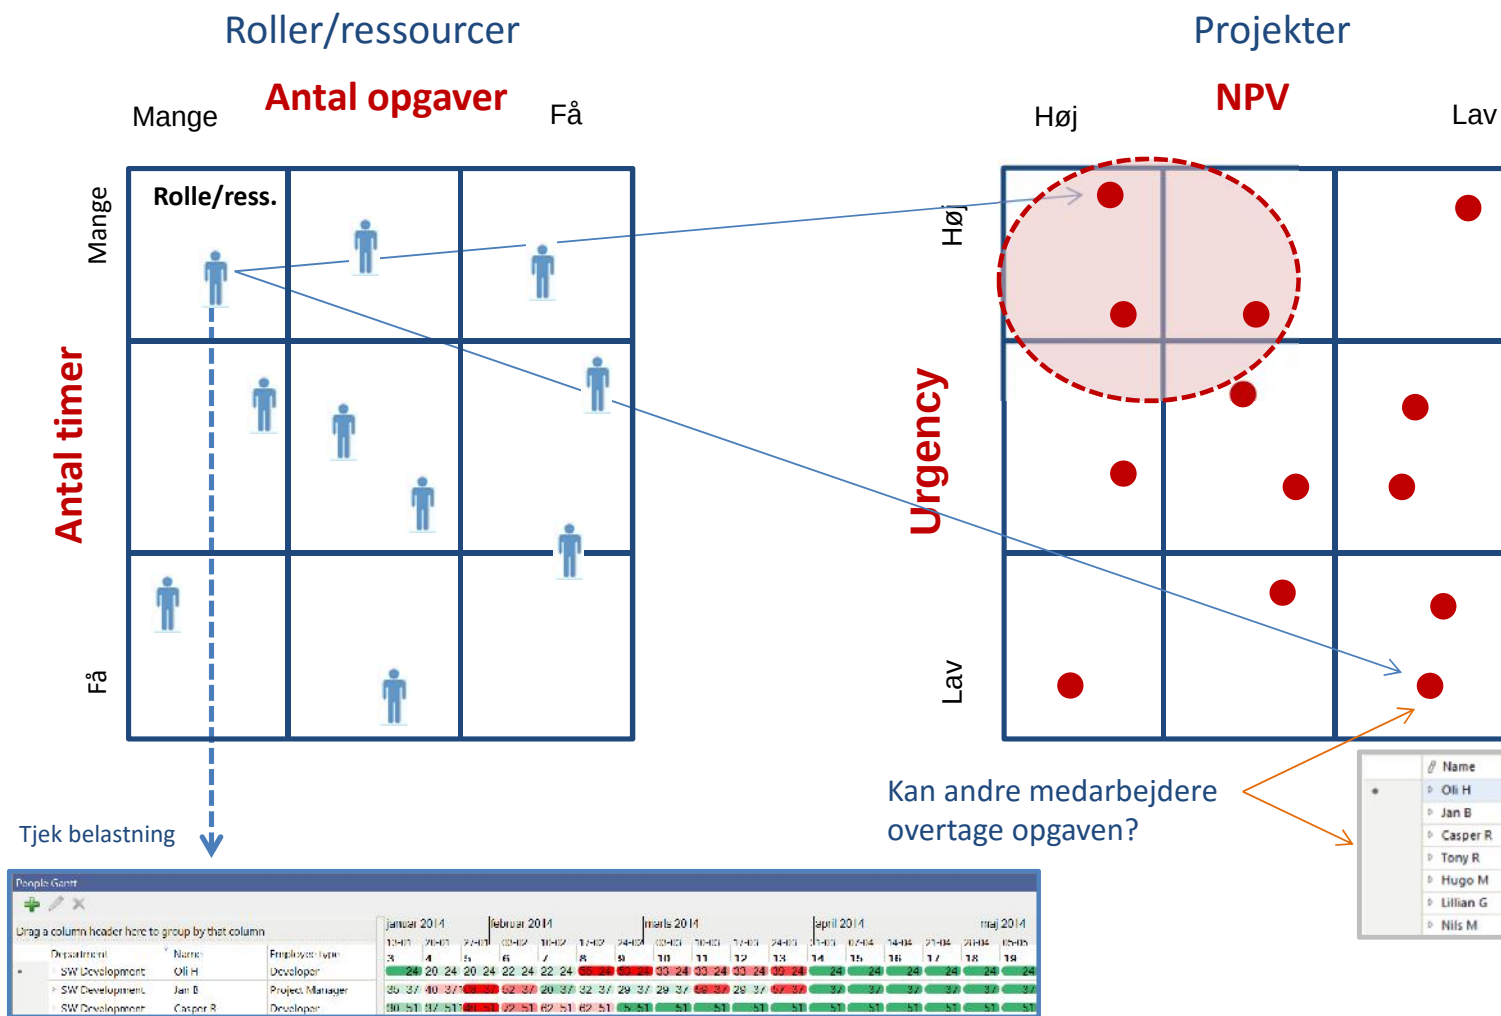


Portefølje- og ressourcestyring


NPV og Urgency

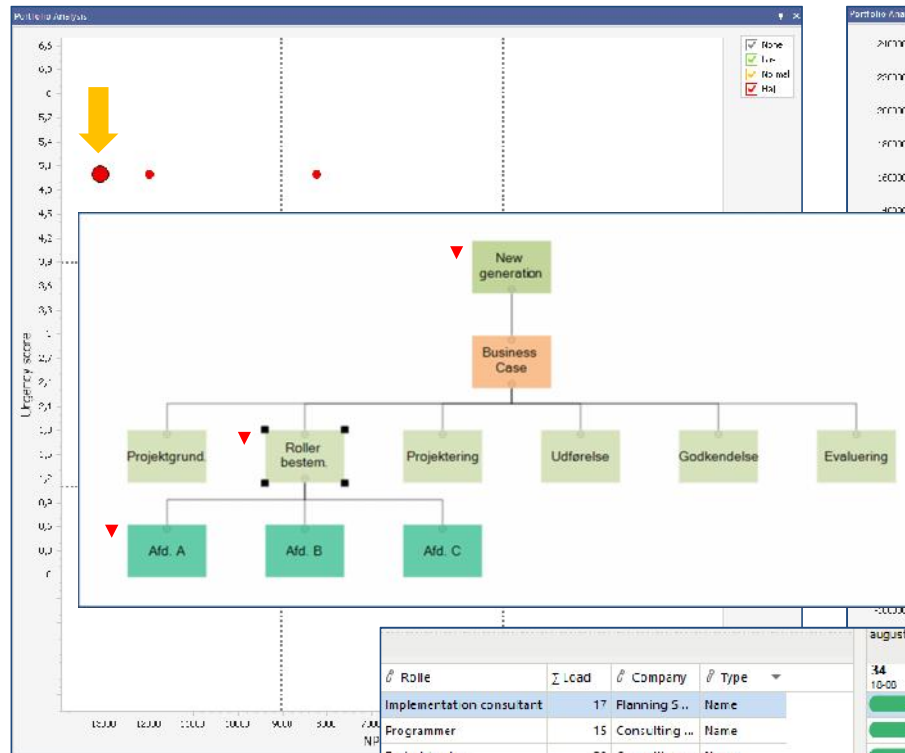


Tidsafvigelse og økonomiafgivelser

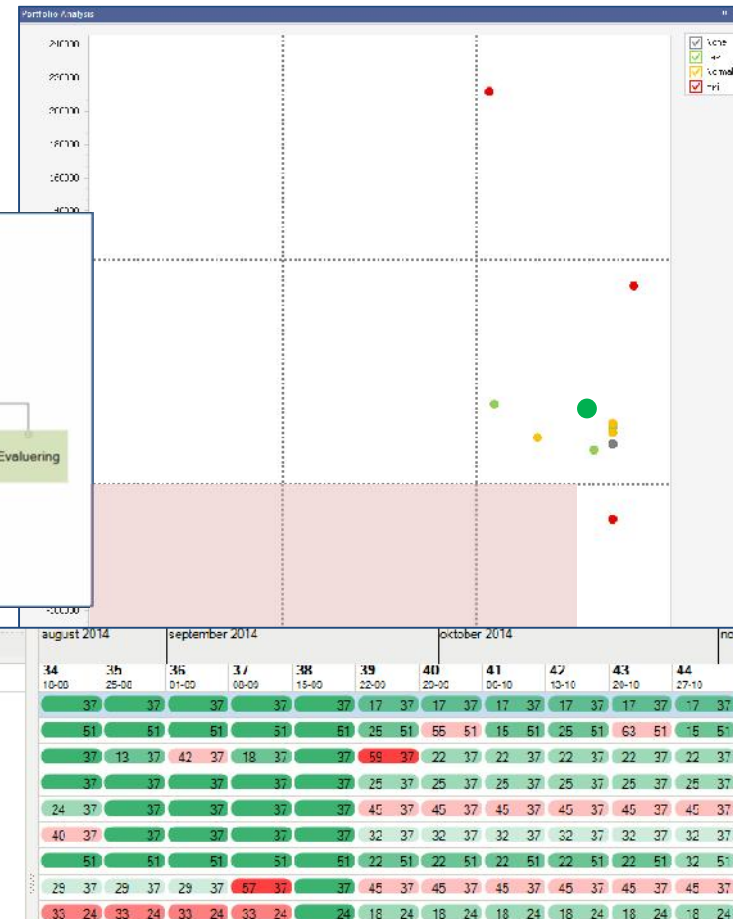

Kapacitet og belægning – hvad kan lade sig gøre?

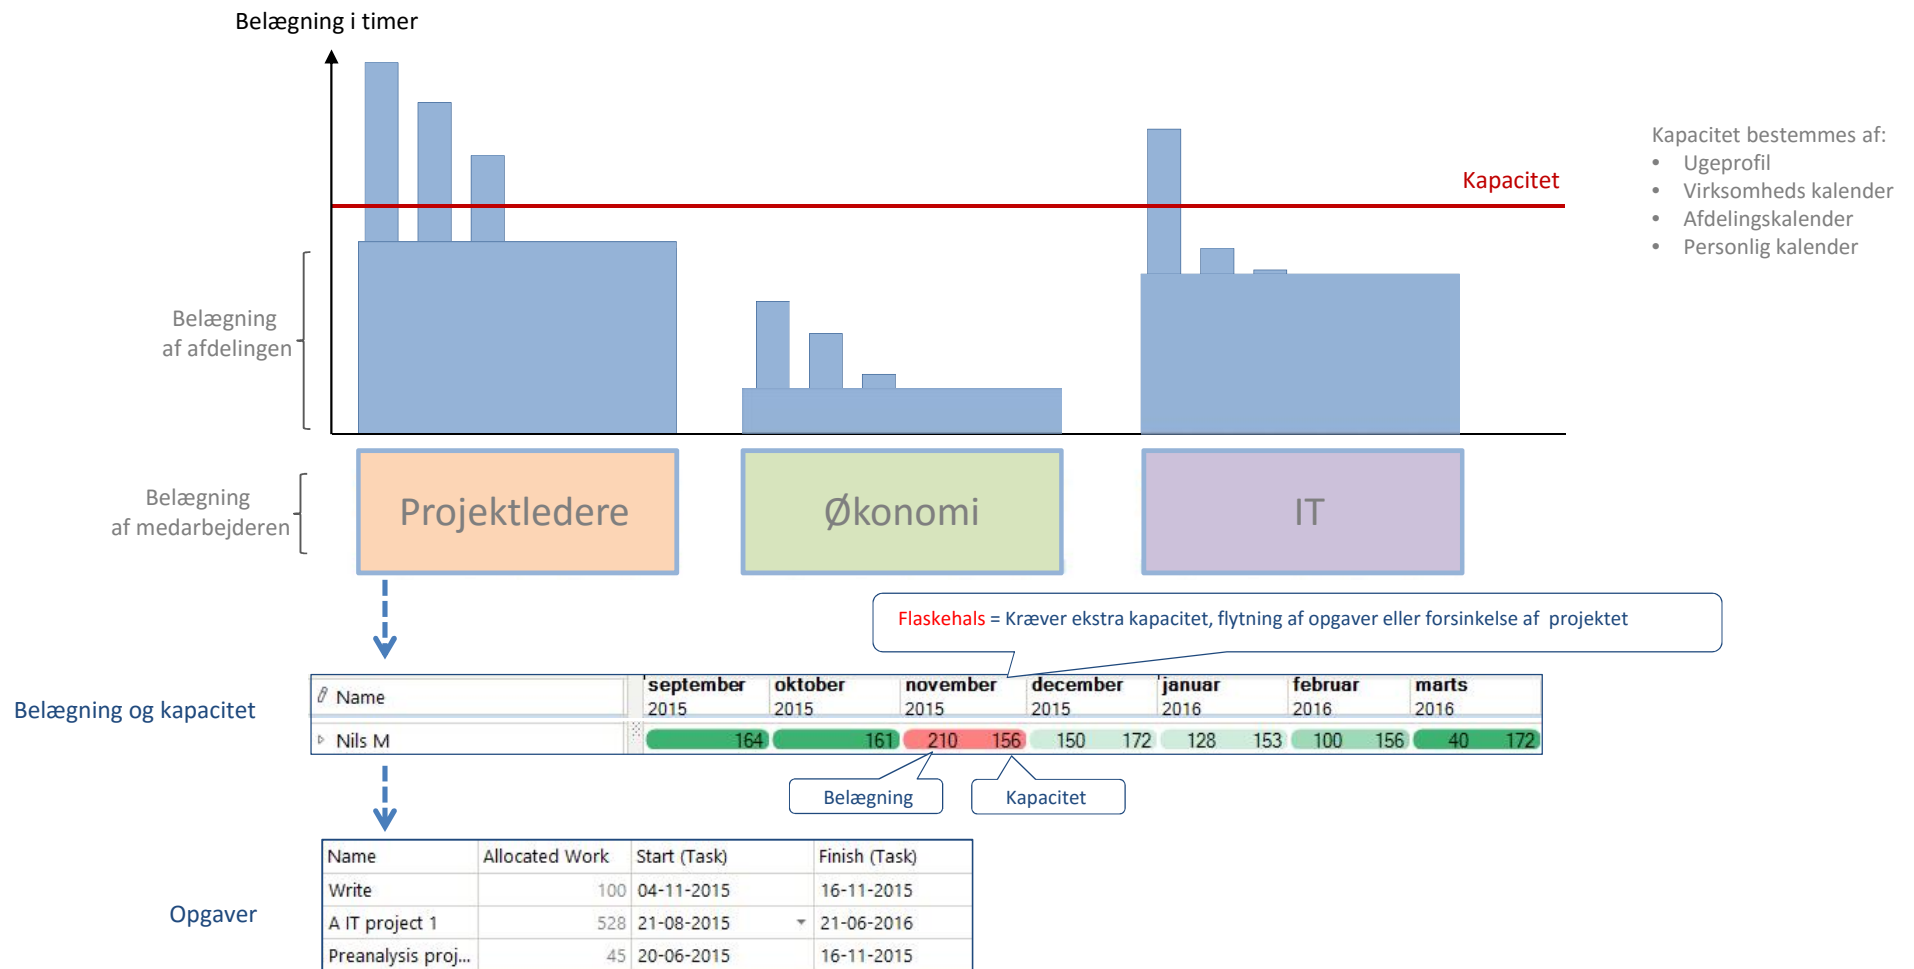


Synkroniseret projekt – og ressource Gantt-Kort

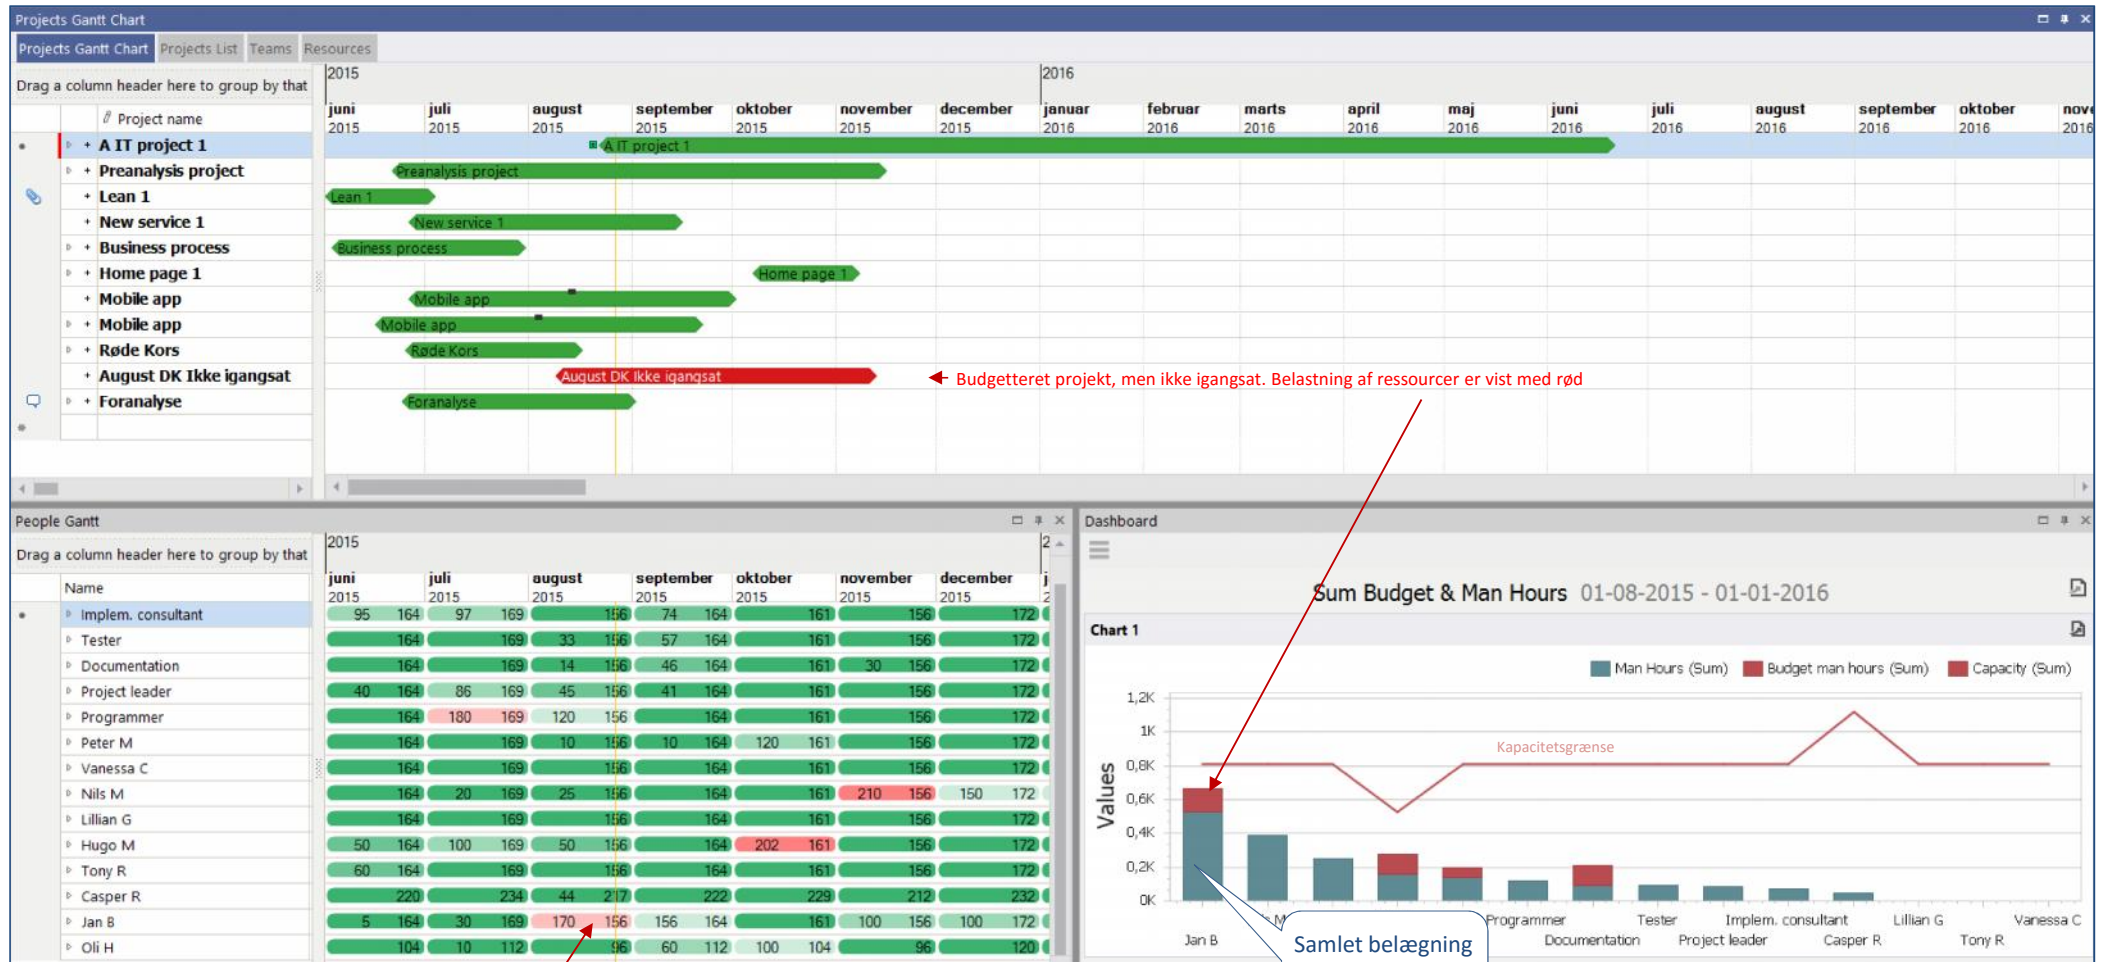

Ikke tilstrækkelig med kapacitet i august

Synkroniseret projekt – og ressource Gantt-Kort

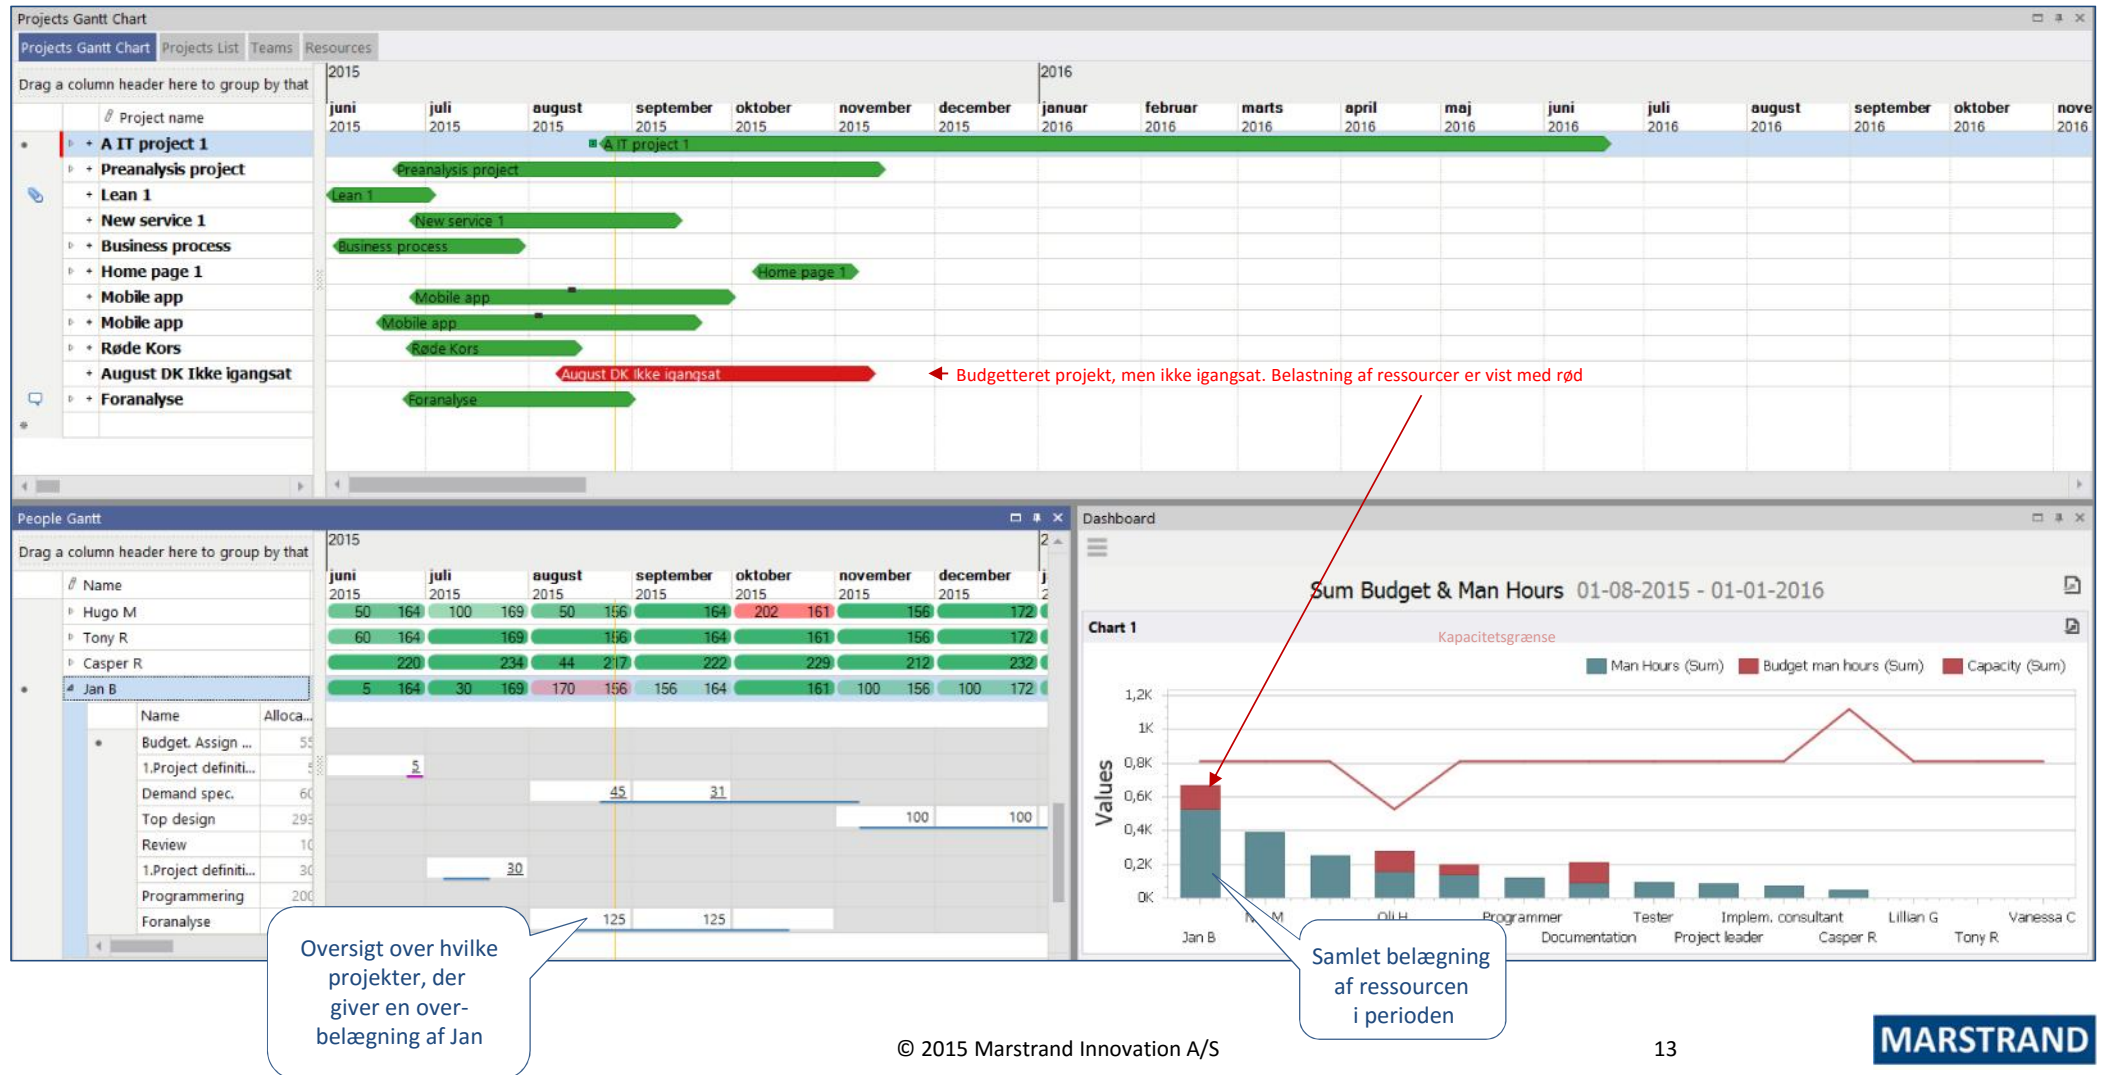

Vi omsætter Business Casen til virkelighed

MPI giver noget ingen andre kan:


Overblik, gennemsigtighed og handlekraft
- med ét fælles system.



Ledelse



Projektchef



Projektleder



Ressourceejjer



Medarbejder



Leverandør

Investeringer og gevinster på tidslinje


Projektejer

Projektleder

Ide/Business Case

Projekt A levetid

Levetid for projekt A resultater

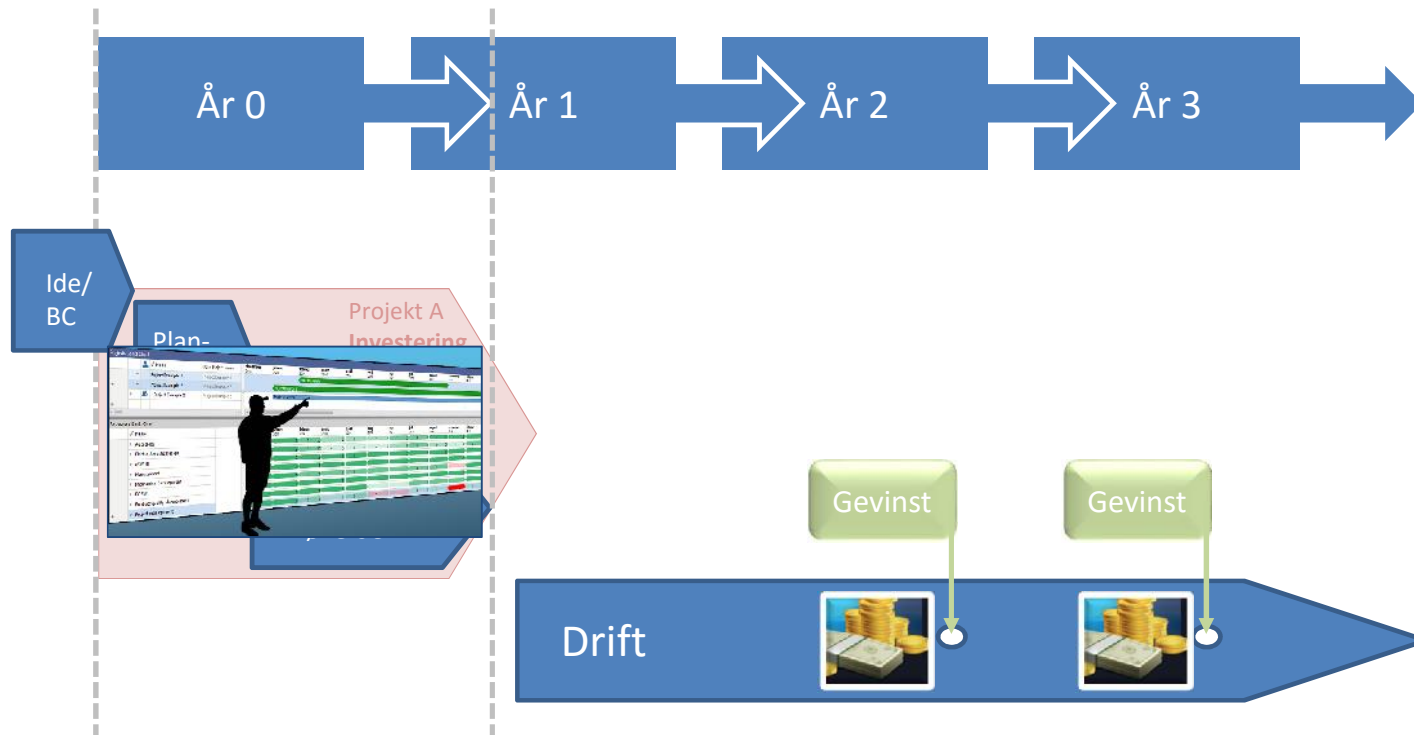

MARSTRAND

Planlagte investeringer og gevinster

Projekt A

